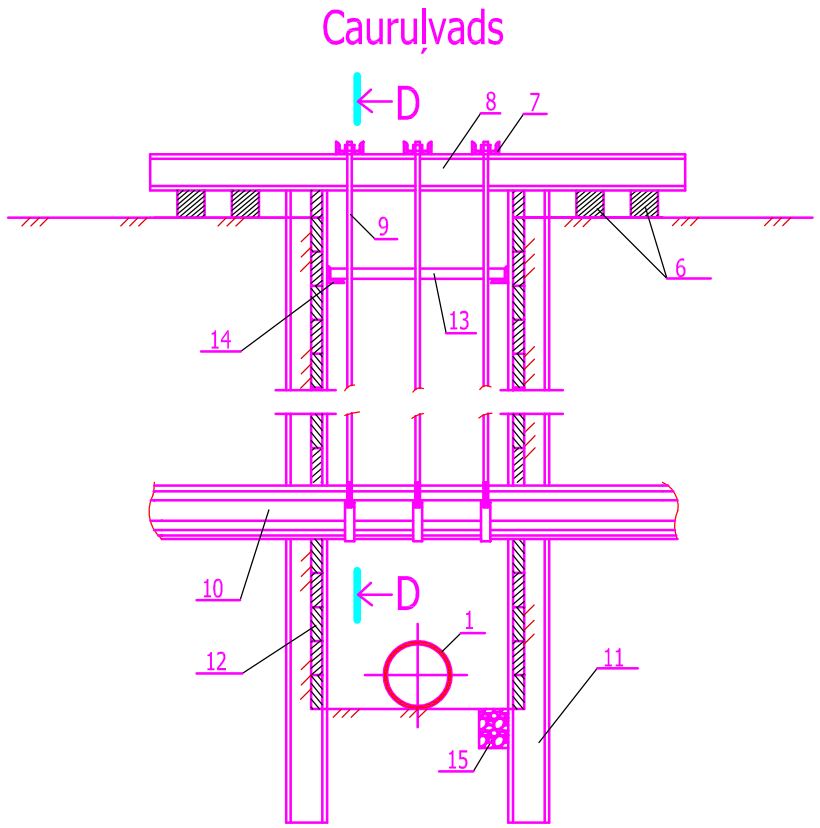



Apzīmējumi

1- izbūvējamais cauruļvads
2- dēļu, vairogu kaste vai kabeļu aizsargcaurules ARROT
3- stiepļu vīts stiprinājums
4- koka baļķis vai balstbrusa
5- kabelis
6- paliktnis
7- šķērši no U profila sijām
8- dubult T profila sija
9- spaļdzelzs ar vītni galā un uzgriezni
10- tranšeju šķērsojošais cauruļvads
11 -platmalu dubult T sijas, caurules d=100x5 mm vai sīkbaļķi ne retāk par 1,5 m
12- grunts nogāzes stiprinājuma dēļi
13- spraislis
14- saites
15- pagaidu pazeminošā drenāža (aizpildīta ar vid. rupju granti)

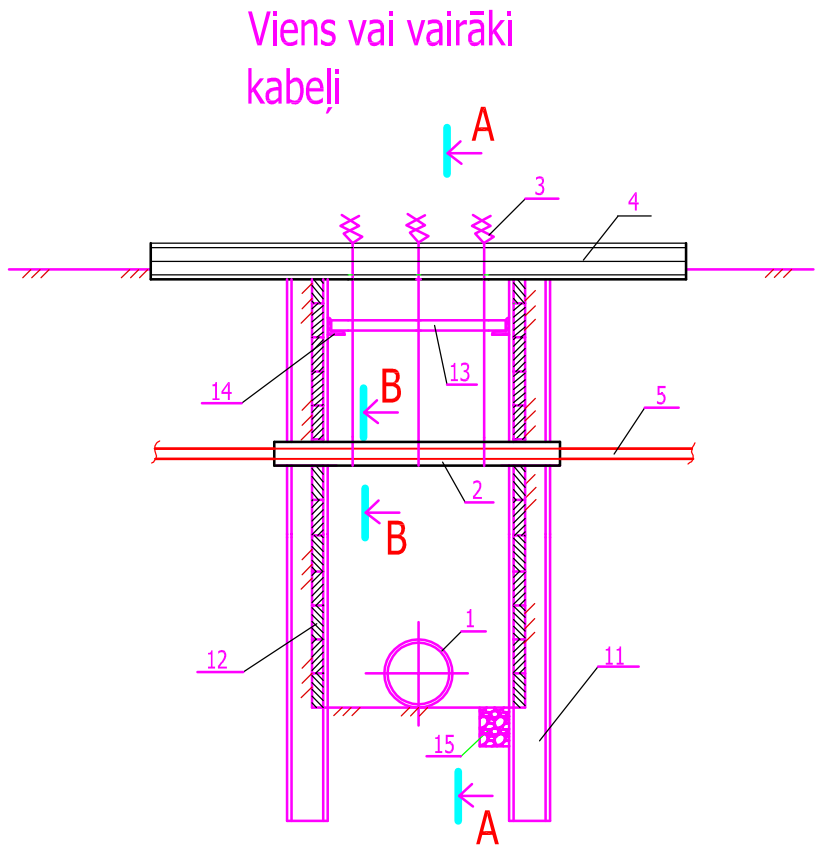

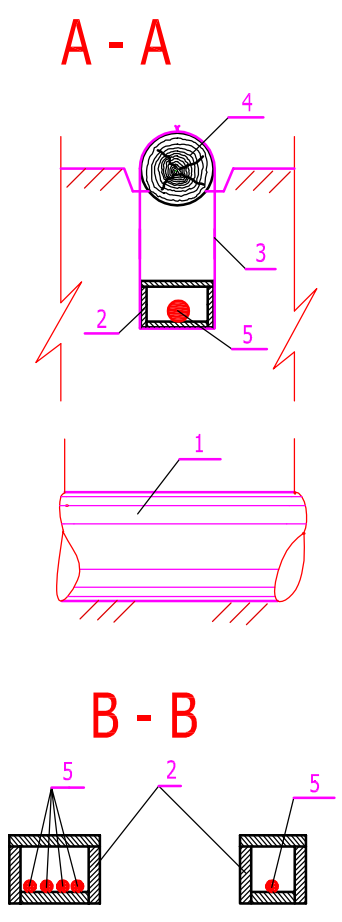

Piezīmes

1.Norādījumus par būvlaukuma organizēšanu un būvdarbu veikšanu skatīt paskaidrojuma rakstā.

2.Doto lapu skatīt kopā ar DOP - 2 lapu un būvprojekta ŪKT, ELT un SAT daīām.

3.Kabeļu aizsardzības zonā (1 m attālumā no malējiem kabeļiem uz katru pusi) aizliegts veikt darbus ar zemes rokamām mašīnām.

4.Kabeļu atrakšanā, noņemot asfalta segumu vai bruģi, pneimatiskos instrumentus vai lauzni nelietot dziļāk par 0,3 m.

5.Kabeļu atrakšanas zonu nosaka rakšanas atļaujā un šo zonu paplašināt aizliegts.

6.Ja, veicot zemes darbus, atrok kabeli, kas nav norādīts dokumentācijā, darbi pārtraucami, nodrošināma kabeļa saglabāšana, izsaucami elektrtīklu pārstāvji, bet, ja kabelis sarauts, jāinformē EL tīkli un jāorganizē līnijas remonts par saviem līdzekļiem.

SIA Agroprojekts RB NĀKOTNES IELĀ 14-26, ĶEKAVA , ĶEKAVAS PAG., LV-2123				LĪVĀNU NOVADA DOME			LND/5-44.3/11.47 (03-2011)
				JAUNSILAVAS PAMATSKOLAS ĒKAS RENOVĀCIJA ATBILSTOŠI AUGSTĀM ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBĀM			
				TRANŠEJU ŠĶĒRSOJOŠO KOMUNIKĀCIJU STIPRINĀJUMU TIPVEIDA RISINĀJUMI	Stadija	Lapa	Lapas
Būvpr.vad.	I.Rudzītis				TP	DOP - 3	
Būvinženiere	A.Goba						
				Reģ. Nr.			
